


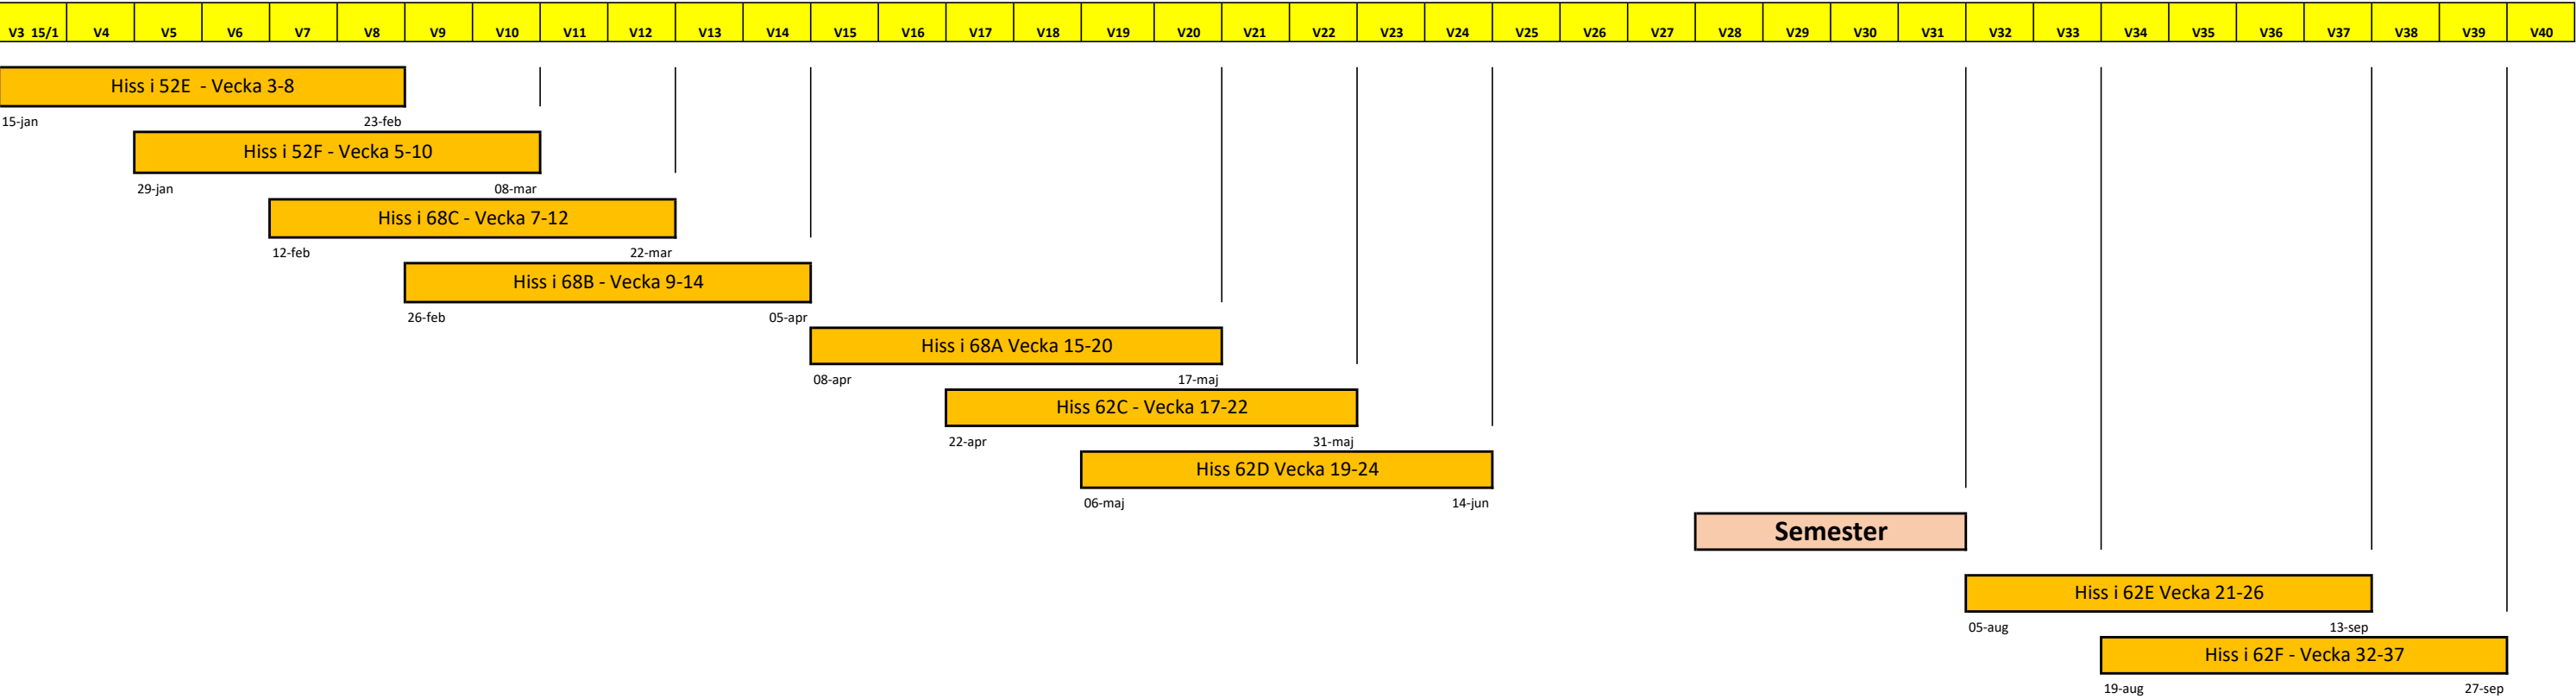

Österleden hissinstallationen

Verksamhet	Planerad start	Duration (dagar)	Vecka 1	Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 5	Vecka 6
Rivning Maskin & Montage		10						
Byggplatskontroll		1						
Hissinstallation Schindler		16						
Driftsättning (Schindler)		5						
Plåtarbete (M&M)		5						
SAIS/Besiktning (Schindler)		1						
